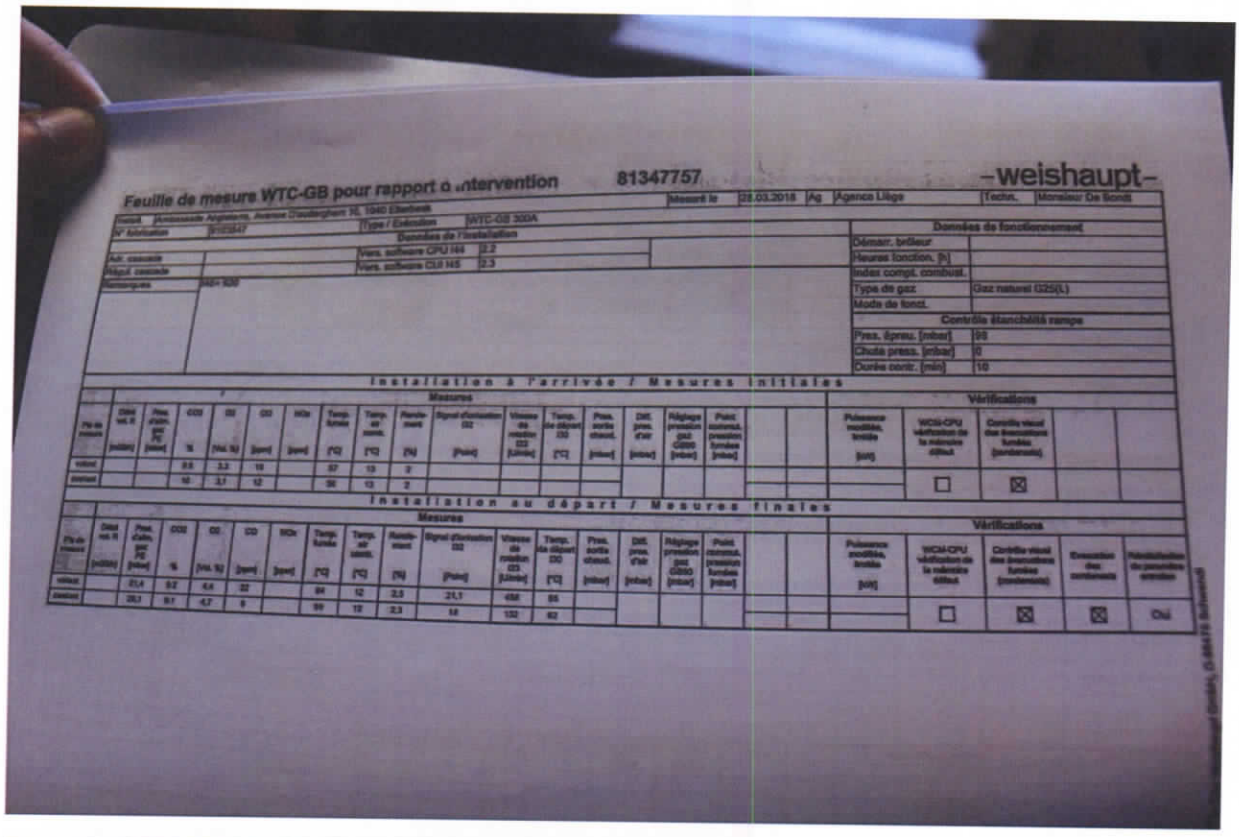

Feuille de mesure WTC-GB pour rapport d'intervention 81347757 -weishaupt-

Mesuré le 28.03.2018 | Ag. | Agence Liège | Techn. | Monsieur De Bondt

Client | Ambassade Angleterre, Avenue d'Auderghem 16, 1040 Etterbeek

N° fabrication | 8103847 | Type / Exécution | WTC-GB 30/A

Données de l'installation

Adr. cascade | Vers. software CPU H4 | 2.2

Régul. cascade | Vers. software CLII H5 | 2.3

Remarques | H4= 820

Données de fonctionnement

Démarr. brûleur	
Heures fonction. [h]	
index compt. combust.	
Type de gaz	Gaz naturel G25(L)
Mode de fonct.	

Contrôle étanchéité rampe

Pres. éprou. [mbar]	98
Chute press. [mbar]	0
Durée contr. [min]	10

Installation à l'arrivée / Mesures initiales

Pt de mesure	Débit vol. % [m³/h]	Pres. d'alim. gaz [mbar]	CO2 %	O2 [Vol. %]	CO [ppm]	NOx [ppm]	Temp. fumée [°C]	Temp. air comb. [°C]	Ventil. marche [%]	Signal d'ionisation DI2 [Point]	Vitesse de rotation DI3 [1/min]	Temp. de départ DI5 [°C]	Pres. sortie chaud. [mbar]	Dif. pres. d'air [mbar]	Réglage pression gaz G250 [mbar]	Point. commut. pression fumées [mbar]			Puissance modifiée, limitée [kW]	WCM-CPU vérification de la mémoire défaut	Contrôle visuel des fonctions fumées (condensats)		
volant			9.6	3.3	10		57	13	2											☐	☒		
contact			10	3.1	12		56	13	2														

Installation au départ / Mesures finales

Pt de mesure	Débit vol. % [m³/h]	Pres. d'alim. gaz [mbar]	CO2 %	O2 [Vol. %]	CO [ppm]	NOx [ppm]	Temp. fumée [°C]	Temp. air comb. [°C]	Ventil. marche [%]	Signal d'ionisation DI2 [Point]	Vitesse de rotation DI3 [1/min]	Temp. de départ DI5 [°C]	Pres. sortie chaud. [mbar]	Dif. pres. d'air [mbar]	Réglage pression gaz G250 [mbar]	Point. commut. pression fumées [mbar]			Puissance modifiée, limitée [kW]	WCM-CPU vérification de la mémoire défaut	Contrôle visuel des fonctions fumées (condensats)	Evacuation des condensats	Fonctionnement de garniture étanche
volant		21,4	9.2	4.4	22		64	12	2.3	21,1	4500	65								☐	☒	☒	☒
contact		20,3	9.1	4.7	9		59	12	2.3	18	1320	62											

© by Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi

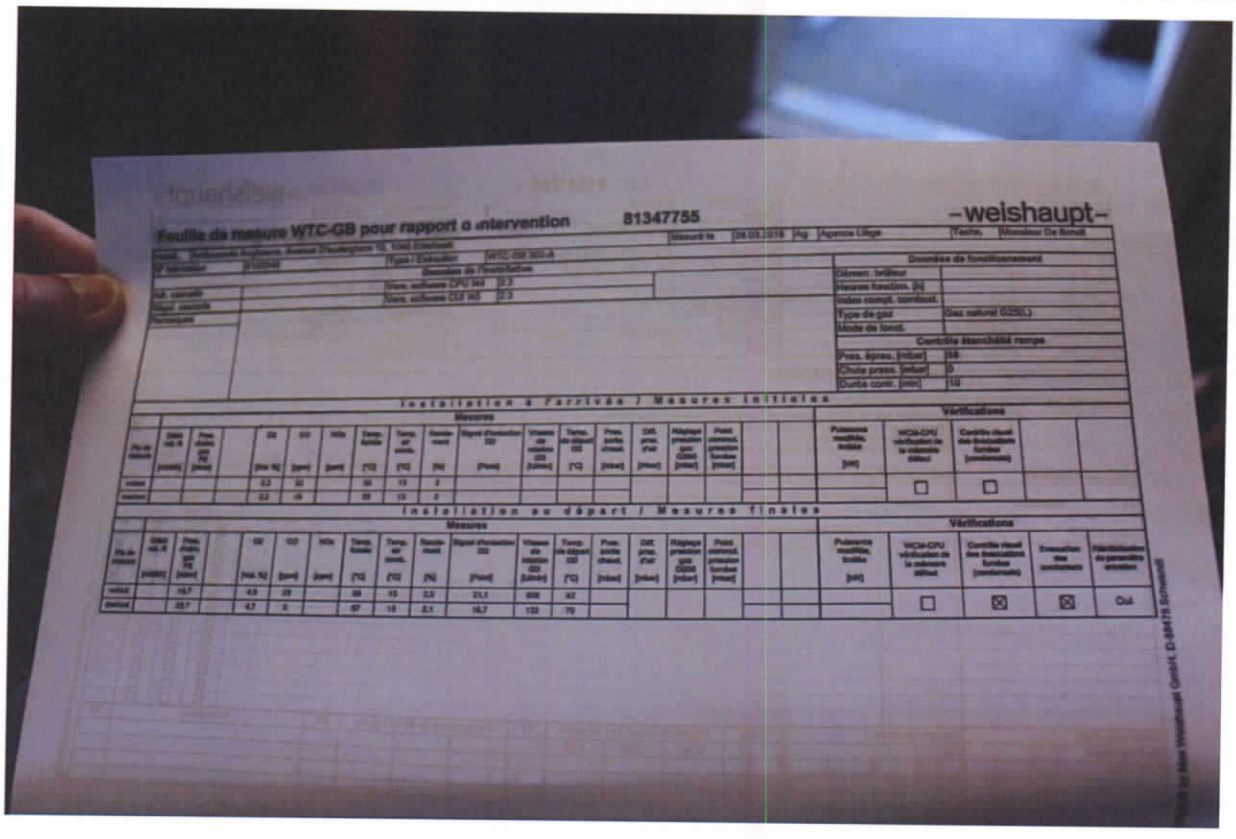

Feuille de mesure WTC-GB pour rapport d'intervention 81347755 -weishaupt-

Mesuré le 28.03.2018 | Ag. | Agence Liège | Techn. | Monsieur De Bondt

Client | Ambassade Angleterre, Avenue d'Auderghem 16, 1040 Etterbeek

N° fabrication | 8103846 | Type / Exécution | WTC-GB 30/A

Données de l'installation

Adr. cascade | Vers. software CPU H4 | 2.3

Régul. cascade | Vers. software CLII H5 | 2.3

Remarques

Données de fonctionnement

Démarr. brûleur	
Heures fonction. [h]	
index compt. combust.	
Type de gaz	Gaz naturel G25(L)
Mode de fonct.	

Contrôle étanchéité rampe

Pres. éprou. [mbar]	98
Chute press. [mbar]	0
Durée contr. [min]	10

Installation à l'arrivée / Mesures initiales

Pt de mesure	Débit vol. % [m³/h]	Pres. d'alim. gaz [mbar]		O2 [Vol. %]	CO [ppm]	NOx [ppm]	Temp. fumée [°C]	Temp. air comb. [°C]	Ventil. marche [%]	Signal d'ionisation DI2 [Point]	Vitesse de rotation DI3 [1/min]	Temp. de départ DI5 [°C]	Pres. sortie chaud. [mbar]	Dif. pres. d'air [mbar]	Réglage pression gaz G250 [mbar]	Point. commut. pression fumées [mbar]			Puissance modifiée, limitée [kW]	WCM-CPU vérification de la mémoire défaut	Contrôle visuel des fonctions fumées (condensats)		
volant				3.2	32		55	13	2											☐	☐		
contact				3.2	28		59	13	2														

Installation au départ / Mesures finales

Pt de mesure	Débit vol. % [m³/h]	Pres. d'alim. gaz [mbar]		O2 [Vol. %]	CO [ppm]	NOx [ppm]	Temp. fumée [°C]	Temp. air comb. [°C]	Ventil. marche [%]	Signal d'ionisation DI2 [Point]	Vitesse de rotation DI3 [1/min]	Temp. de départ DI5 [°C]	Pres. sortie chaud. [mbar]	Dif. pres. d'air [mbar]	Réglage pression gaz G250 [mbar]	Point. commut. pression fumées [mbar]			Puissance modifiée, limitée [kW]	WCM-CPU vérification de la mémoire défaut	Contrôle visuel des fonctions fumées (condensats)	Evacuation des condensats	Fonctionnement de garniture étanche
volant		19,7		4.9	29		68	15	2.3	21,1	6000	82								☐	☒	☒	☒
contact		20,7		4.7	6		67	15	2.1	16,7	1320	70											

© by Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi
